


BLOCCO DI LAVORI

N. ORD.	COD.	ATTIVITÀ	INIZIO	FINE	DURATA gg.
1	1	ALLESTIMENTO CANTIERE	04/01/2016	09/01/2016	5
2	2	PONTEGGI	11/01/2016	16/01/2016	5
3	3	DEMOLIZIONI	18/01/2016	30/01/2016	12
4	4	TRAMEZZATURE	01/02/2016	06/02/2016	5
5	5	RESTAURO FRONTALINI E LESENE	08/02/2016	27/02/2016	19
6	6	IMPIANTO IDROSANITARIO	08/02/2016	27/02/2016	19
7	7	IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE	08/02/2016	16/02/2016	8
8	8	ASSISTENZA MURARIA IMPIANTO ELETTRICO	22/02/2016	25/02/2016	3
9	9	IMPIANTO ELETTRICO	22/02/2016	12/03/2016	19
10	10	INTONACI	14/03/2016	26/03/2016	12
11	11	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	28/03/2016	09/04/2016	12
12	12	URBANIZZAZIONI PIAZZALE	28/03/2016	14/05/2016	47
13	13	OPERE IN FERRO E SERRAMENTI	11/04/2016	16/04/2016	5
14	14	TINTEGGIATURE	18/04/2016	29/04/2016	11
15	15	SMOBILIZZO CANTIERE	16/05/2016	21/05/2016	5

DURATA (gg)

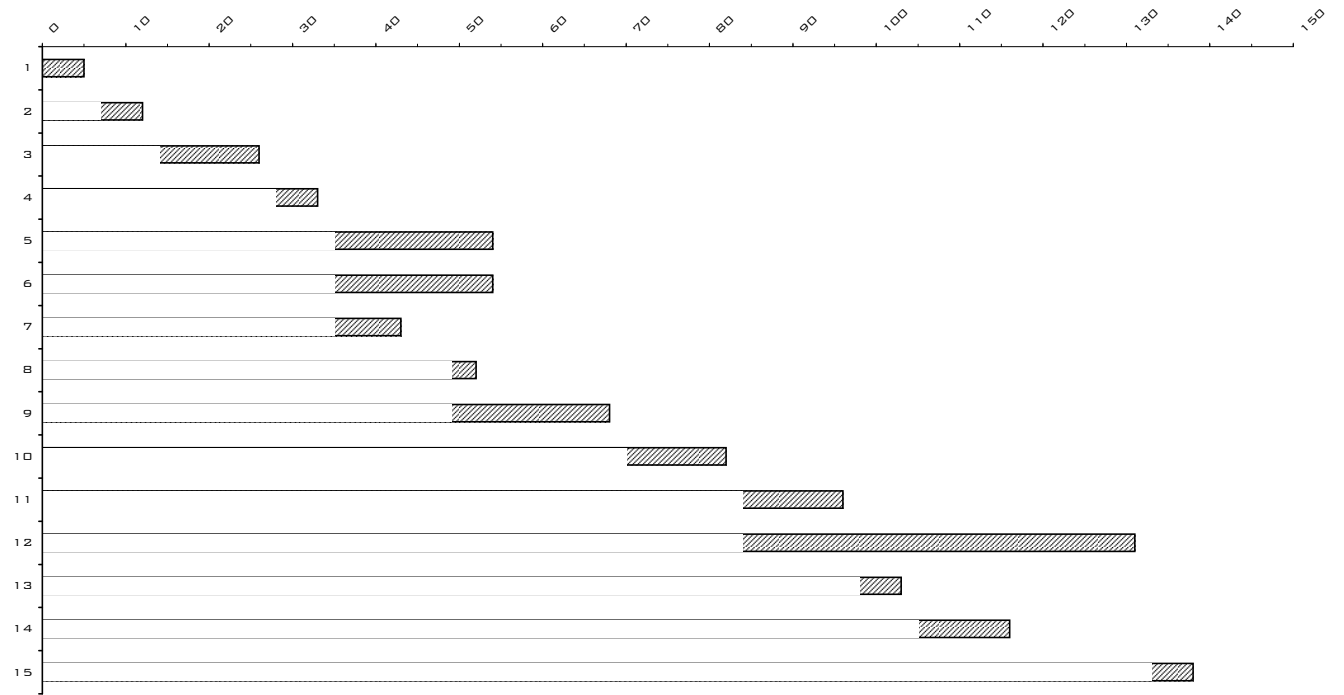

IL DIAGRAMMA PREVEDE L'INIZIO LAVORI IN DATA 04/01/2016, DATA PURAMENTE

INDICATIVA, UTILIZZATA SOLO PER IMPOSTARE E DEFINIRE IL CRONOPROGRAMMA.

L'ELEMENTO UTILE E' LA DURATA COMPLESSIVA DEI LAVORI E LA LORO

ORGANIZZAZIONE.

INIZIO DEI LAVORI
04/01/16

FINE LAVORI
30/05/16

138 gg.

DURATA LAVORI IN GIORNI NATURALI CONSECUTIVI
